


# Projekt Budget

Die Budgets werden zunächst in der App "Rechnungsstellung" im Menü Konfiguration im Abschnitt "Kostenverfolgung" konfiguriert.

- Kostengruppen (wir können Kostengruppen nach DIN276 importieren)
- Obergruppen
- Gewerke (hierüber wird abgerechnet)

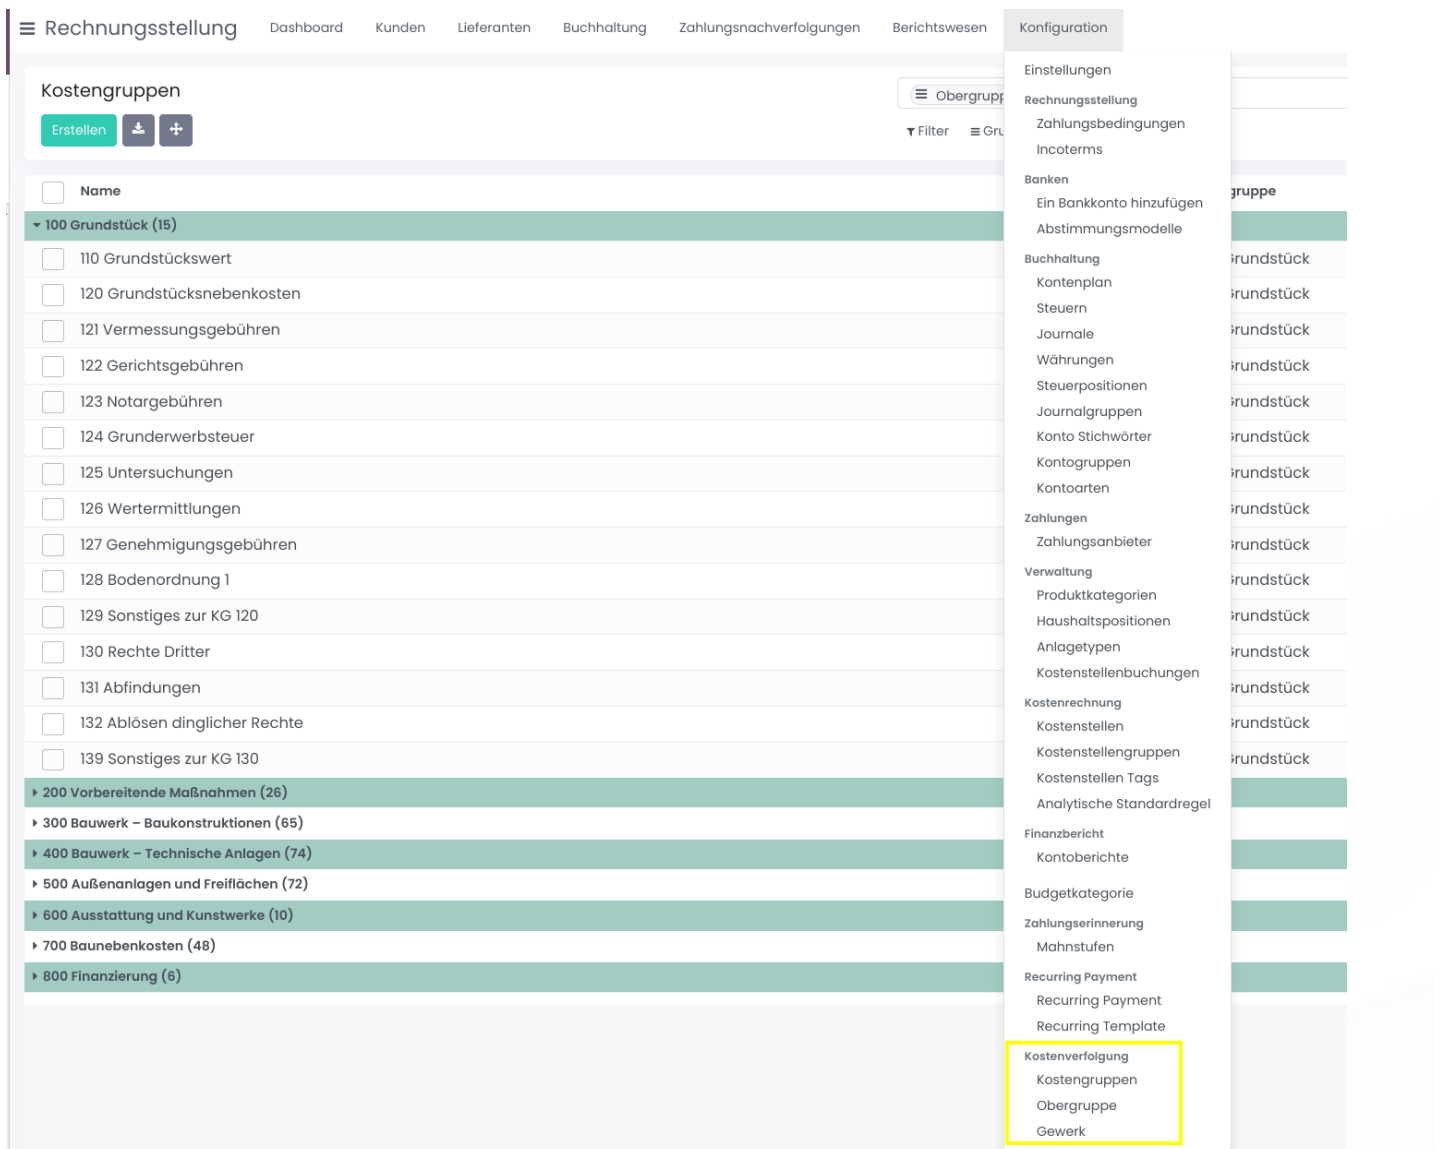

Die Budgets werden in der App "Rechnungsstellung" unter Buchhaltung - Budgets erfasst

☎ +49 2761 835 10 72 @ invoice@smartbrix.io 🌐 <http://www.smartbrix.io>

### Budgets

Suchen ...

Erstellen

<input type="checkbox"/>	Budgetname	Startdatum	Endtermin	Ver...
<input type="checkbox"/>	Maxi Supermarkt	01.01.2024	31.07.2025	Adr...

**Sonstiges**

- Journalbuchungen
- Buchungszeilen

**Journale**

- Verkauf
- Einkäufe
- Bank und Bargeld
- Sonstiges

**Hauptbücher**

- Hauptbuch
- Partnerbuch

**Verwaltung**

- Budgets

Im Budget gibt es zwei Tabellen

- Kostenschätzung (negativer Betrag, da Ausgabe)
- Kostenplanung (Vergabewerte, z.B. aus Angeboten)
  - Über Start- und Enddatum könne die Abschlagszahlungen grob geplant werden. Der Gesamtbetrag wird gleichmäßig auf den Zeitraum umgelegt.

Budgets / Maxi Supermarkt

Bearbeiten Erstellen Aktion

Genehmigen Budget stornieren Neue Version erstellen

Entwurf Abgesagt Bestätigt Bestätigt Erledigt

\$ 1 Versionen

### Maxi Supermarkt

**Verantwortlich** Administrator  
**Projekt**  
**Version** 1  
**Haupt-Budget** Maxi Supermarkt

**Zeitraum** 01.01.2024 - 31.07.2025  
**Objekt**  
**Typ**

**Budgetgrenzen**

Kostengruppe	Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Ergebnis - Planung	Tatsächlicher Betrag	Ergebnis - Tatsächlich
715 Vergabeverfahren	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
591 Baustelleneinrichtung	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%
	0,00	0,00	0%	0,00	0%

[Zeile hinzufügen](#)

Haushaltslage	Kostenstelle	Startdatum	Endtermin	Geplanter Betra...	Info	Tatsächliche M...	Theoretische M...	Leistung
100.000 Kaufpreis	G_240227	01.02.2024	01.02.2024	2.500.000,00 €		0,00 €	2.500.000,00 €	0% <a href="#">Einträge...</a>
400.053 Elektroinstallationsarbeiten / Niederspannung (Kabel)		01.01.2024	31.07.2025	-60.000,00 €		0,00 €	-6.031,20 €	0% <a href="#">Einträge...</a>
				2.440.000,00		0,00	2.493.968,80	

Schätzung und Planung werden gegeneinander gerechnet, um die Einhaltung des Budgets zu überprüfen.

Durch Bestätigung wird das Budget festgeschrieben, es können jedoch weitere Versionen angelegt werden, so dass es eine Budgethistorie gibt.

Die Positionen aus der Kostenplanung können im Budget manuell erfasst werden oder über Aufträge im Modul Einkauf diesem Budget zugeordnet werden.

Einkauf   Aufträge   Produkte   Berichtswesen   Konfiguration

Angebotsanfragen / P00002

Bearbeiten   Erstellen

Drucken   Aktion

Bestellung per E-Mail senden   Rechnung erstellen   Stornieren   Sperren   **Zu Budget zuweisen**   Angebotsanfrage   Anfrage gesendet   Bestellung

Bestellung  
☆ P00002

Lieferant   Bauunternehmung Müller

Bestätigungsdatum   20.09.2023 13:06:06

Lieferantenreferenz

Lieferdatum   20.09.2023 13:03:17 (vom Lieferanten bestätigt)

**Budget**   Maxi Supermarkt

Um Bestätigung bitten

Projekt   Maxi Supermarkt

Produkte   Weitere Informationen

Produkt	Beschreib...	Wartungs...	Gewerk	Menge	Erhalten	Abgerech...	Maßeinheit...	Einzelpreis...	Steuern	Zwischensu...
Malerarbeiten	Malerarbeiten		300.034 Maler- und Lackierarbeiten	20,00	0,00	0,00	m <sup>2</sup>	20,00	19% Vorsteuer	400,00 €

Produkt hinzufügen   Abschnitt hinzufügen   Notiz hinzufügen

Nettobetrag: 400,00 €  
USt 19%: 76,00 €  
Gesamt: 476,00 €

Über die o.g. Eingaben planen wir das Budget. Wird eine Rechnung erfasst und eine Position mit der Kostenstelle aus dem Projekt und einem Gewerk aus dem Budget verknüpft, wird aus der Planung im Budget ein "Tatsächlicher Wert".

Weitere Auswertmöglichkeiten zu den Budgets gibt es im Menü "Berichtswesen" unter "Budgetanalyse"

Rechnungsstellung   Dashboard   Kunden   Lieferanten   Buchhaltung   Zahlungsnachverfolgungen   Berichtswesen   Konfiguration

**Budgetanalyse**

↓ +

Obergruppe	Kostengruppe	Haushaltslage
Maxi Supermarkt (2)		
100 Grundstück (1)		
100 Grundstück	110 Grundstückswert	100.000 Kaufpreis
400 Bauwerk - Technische Anlagen (1)		
400 Bauwerk - Technische Anlagen	442 Eigenstromversorgungsanlagen	400.053 Elektroinstallationsarb

Finanzbericht

- Bilanz
- Gewinn- und Verlust
- Kostenverfolgungs-Version
- Partnerberichte
- Partnerbuch
- Alter Partnerausgleich
- Überfällige Forderungen
- Überfällige Zahlungen
- Prüfberichte
- Hauptbuch
- Probabilanz
- Steuerbericht
- Journal Prüfung
- Daily Reports
- Day Book
- Cash Book
- Bank Book
- Verwaltung
- Rechnungsanalyse
- Budgetanalyse**
- Anlagegüter

Budgets > Obergruppe ✕ Suchen ...

1-1 / 1

	Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Info	Tatsächliche Menge	Ergebnis - Schätzer
	0,00	2.440.000,00		0,00	
	0,00	2.500.000,00		0,00	
	0,00	2.500.000,00 €		0,00 €	0
	0,00	-60.000,00		0,00	
	0,00	-60.000,00 €		0,00 €	0

+49 2761 835 10 72 @ invoice@smartbrix.io http://www.smartbrix.io

SMARTBRIX GmbH • GF: Nina Rotermund, Tobias Hammeke • USt.-ID: DE341219498 • Amtsgericht Olpe HRB 11030  
Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG • IBAN: DE70 4626 1822 0020 2235 00 • BIC: GENODEM1WDD
